

Programa de la USAID No. 522-0410

USAID Program No. 522-0410

04-683

AMENDMENT No. 3 TO THE SPECIAL OBJECTIVE GRANT AGREEMENT  
(ENMIENDA No. 3 AL CONVENIO DE DONACION DE OBJETIVO ESPECIAL)

BETWEEN  
(ENTRE)

THE REPUBLIC OF HONDURAS  
(LA REPUBLICA DE HONDURAS)

AND  
(Y)

THE UNITED STATES OF AMERICA  
(LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

FOR  
(PARA)

HURRICANE RECONSTRUCTION PROGRAM (HRP)  
(PROGRAMA DE RECONSTRUCCION POR EL HURACAN (HRP))

Tegucigalpa, Honduras

16 de agosto de 1999

ENMIENDA AL CONVENIO DE  
DONACION DE OBJETIVO ESPECIAL

Programa de la USAID No. 522-0410  
Programa de Reconstrucción por el  
Huracán

ENMIENDA No. 3, fechada de agosto de 1999, entre los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, actuando a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ("USAID"), y la REPUBLICA DE HONDURAS ("Donatario o GdeH"), actuando a través de la Secretaría de Finanzas (SdeF).

CONSIDERANDO, que el Donatario y la USAID celebraron un Convenio de Donación de Objetivo Especial fechado 9 de junio de 1999, dicho Convenio de Donación de Objetivo Especial tal como ha sido enmendado es referido en lo sucesivo como el "Convenio"; y

CONSIDERANDO, que el Donatario y la USAID desean enmendar el Convenio para incluir actividades adicionales bajo el Programa de Reconstrucción por el Huracán y para proporcionar un incremento en el financiamiento por la cantidad de US\$99,000,000.

POR LO TANTO, las Partes del mismo por este medio acuerdan que el Convenio deberá ser enmendado como sigue:

1. La Sección 2.2, Resultados, del Artículo 2 del Convenio es por este medio enmendada para incluir los siguientes Resultados adicionales bajo una nueva subsección (c):

SPECIAL OBJECTIVE GRANT  
AGREEMENT AMENDMENT

USAID Program No. 522-0410  
Hurricane Reconstruction Program

AMENDMENT No. 3, dated August , 1999, between the UNITED STATES OF AMERICA, acting through the United States Agency for International Development ("USAID"), and the REPUBLIC OF HONDURAS ("Grantee" or "GOH"), acting through the Ministry of Finance (MOF).

WHEREAS, the Grantee and USAID entered into a Special Objective Grant Agreement dated June 9, 1999, said Special Objective Grant Agreement as amended prior to the date hereof is referred to herein as the "Agreement"; and

WHEREAS, the Grantee and USAID desire to amend the Agreement to include additional activities under the Hurricane Reconstruction Program and to provide incremental funding in the amount of US\$99,000,000.

NOW, THEREFORE, the Parties hereto hereby agree that the Agreement shall be amended as follows:

1. Section 2.2, Results, of Article 2 of the Agreement is hereby amended to include the following additional Results under a new subsection (c):

"(c) Componente de la Actividad para el Mejoramiento de la Respuesta de los Gobiernos Locales a las Necesidades de los Ciudadanos (referida en lo sucesivo como la 'Actividad para el Desarrollo Municipal')

(1) Las actividades bajo el componente de la Actividad para el Desarrollo Municipal serán dirigidas al más alto nivel para obtener el resultado intermedio de primer nivel de *Mejoramiento de la Respuesta del Gobierno Local a las Necesidades de los Ciudadanos* (referido en lo sucesivo como el 'IR 5').

(2) Para lograr el IR 5, la USAID y el Donatario buscarán lograr los siguientes resultados intermedios de segundo nivel:

Resultado 5.1 *Restauración de la Salud Financiera e Incremento del Ingreso Municipal*

Resultado 5.2 *Mejoramiento de la Rendición de Cuentas y Transparencia en los Gobiernos Locales*

Resultado 5.3 *Desarrollo de Estrategias para el Desarrollo Urbano"*

2. Las Subsecciones a) y b) de la Sección 3.1 del Convenio son por este medio suprimidas en su totalidad y sustituidas por lo siguiente:

"a) La Donación. Para alcanzar el Objetivo establecido en este Convenio, la USAID, de conformidad con la Ley de Ayuda Exterior de 1961, y sus enmiendas,

"(c) Component for the Improved Responsiveness of Local Governments to Citizen Needs Activity (referred to herein as the 'Municipal Development Activity')

(1) The activities under the component for the Municipal Development Activity will be directed at the highest level at achieving the first-level intermediate result of *Improved Local Government Response to Citizen Needs* (referred to herein as 'IR 5').

(2) To achieve IR 5, USAID and the Grantee will seek to accomplish the following second-level intermediate results:

Result 5.1 *Restored Financial Health and Increased Municipal Income*

Result 5.2 *Improved Accountability and Transparency in Local Government*

Result 5.3 *Development of Urban Development Strategies"*

2. Subsections a) and b) of Section 3.1 of the Agreement are hereby deleted in their entirety and the following are substituted therefor:

"a) The Grant. To help achieve the Objective set forth in this Agreement, USAID, pursuant to the Foreign Assistance Act of 1961, as amended,

por este medio dona al Donatario bajo los términos del Convenio la cantidad no mayor de CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES (\$167,000,000) (la "Donación") la que incluye un incremento de fondos en la cantidad de NOVENTA Y NUEVE MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES (\$99,000,000).

"b) Total Estimado de la Contribución de la USAID. El total estimado de la contribución de la USAID para alcanzar el Objetivo será de CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES (US\$167,000,000), el cual será provisto en incrementos. Los incrementos subsecuentes estarán sujetos a la disponibilidad de fondos para este propósito a la USAID, y al mutuo acuerdo de las Partes de proseguir, al momento del subsecuente incremento."

3. La Sección 6.2 del Artículo 6, Condiciones Especiales, es por este medio suprimida en su totalidad y sustituida por lo siguiente:

"Sección 6.2 Director de la Unidad de Generación de Empleo

El Donatario acuerda que, previo a la Fecha de Terminación, cualquier decisión de reemplazar al Director de la Unidad de Generación de Empleo del Fondo Hondureño de Inversión Social ("FHIS"), o de reestructurar las autoridades, responsabilidades o rol del Director bajo la Actividad de RECAP, la Actividad para el Desarrollo Municipal o cualquier otra actividad bajo este Convenio necesitará la aprobación previa por escrito de la USAID y notificación para la Secretaría de Finanzas."

hereby grants to the Grantee under the terms of the Agreement not to exceed ONE HUNDRED SIXTY-SEVEN MILLION UNITED STATES DOLLARS (US\$167,000,000) (the "Grant") which includes an increase in funding in the amount of NINETY-NINE MILLION UNITED STATES DOLLARS (\$99,000,000).

b) Total Estimated USAID Contribution. USAID's total estimated contribution to the achievement of the Objective will be ONE HUNDRED SIXTY-SEVEN MILLION UNITED STATES DOLLARS (US\$167,000,000), which will be provided in increments. Subsequent increments will be subject to the availability of funds to USAID for this purpose, and the mutual agreement of the Parties, at the time of each subsequent increment, to proceed."

3. Section 6.2 of Article 6, Special Covenants, is hereby deleted in its entirety and the following is substituted therefor:

"Section 6.2 Director of the Employment Generation Unit

The Grantee agrees that, prior to the Completion Date, any decision to replace the Director of the Employment Generation Unit of the Honduran Social Investment Fund ("FHIS"), or to restructure the Director's authorities, responsibilities or role under the RECAP Activity, the Municipal Development Activity or any other activity under this Agreement will require the prior written approval of USAID and notification to the Ministry of Finance."

4. La Sección III, Componentes, del Anexo I al Convenio es por este medio enmendada para incluir como una nueva subsección C. lo siguiente:

"C. Componente de la Actividad para el Mejoramiento de la Respuesta de los Gobiernos Locales a las Necesidades de los Ciudadanos (referido en lo sucesivo como la 'Actividad para el Desarrollo Municipal'). La Actividad para el Desarrollo Municipal está diseñada para ayudar a las municipalidades a tratar las necesidades ocasionadas por los efectos del Huracán Mitch. La Descripción detallada del componente de la Actividad para el Desarrollo Municipal se adjunta como el Adjunto 6 a este Anexo I.

#### (1) Resultados e Indicadores

Las actividades bajo el componente de la Actividad para el Desarrollo Municipal apoyarán el Objetivo a través del alcance del Resultado Intermedio 5 ('IR 5'), *'Mejoramiento de la Respuesta de los Gobiernos Locales a las Necesidades de los Ciudadanos'*, y los Resultados de Segundo Nivel 5.1, *'Salud Financiera Restaurada e Ingreso Municipal Incrementado'*, 5.2, *'Mejoramiento en la Rendición de Cuentas y Transparencia en Gobiernos Locales'*, y 5.3, *'Desarrollo de Estrategias de Desarrollo Urbano'*.

Los indicadores para medir el progreso en el componente de la Actividad para el Desarrollo Municipal se detallan a continuación:

(a) Retorno por lo menos a los niveles de generación de ingresos locales existentes antes del Mitch en 35 municipalidades participantes;

4. Section III, Components, of Annex I to the Agreement is hereby amended to include the following as a new subsection C.:

"C. Component for the Improved Responsiveness of Local Governments to Citizen Needs Activity (referred to herein as the 'Municipal Development Activity'). The Municipal Development Activity is designed to assist municipalities in addressing needs resulting from the effects of Hurricane Mitch. The detailed Activity Description of the component for the Municipal Development Activity is attached as Attachment 6 to this Annex I.

#### (1) Results and Indicators

Activities under the component for the Municipal Development Activity will support achievement of the Objective through the achievement of Intermediate Result 5 ('IR 5'), *'Improved Local Government Response to Citizen Needs'*, and the Second-Level Results 5.1, *'Restored Financial Health and Increased Municipal Income'*, 5.2, *'Improved Accountability and Transparency in Local Government'*, and 5.3, *'Development of Urban Development Strategies'*.

The indicators for measuring progress for the component for the Municipal Development Activity are as follows:

(a) Return to at least pre-Mitch levels of local income generation in 35 participating municipalities;

(b) Desarrollo de Estrategias de Desarrollo Urbano en 40 ciudades secundarias;

(c) Aumento de la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con la reconstrucción;

(d) Rehabilitación y expansión de aproximadamente 25 abastecimientos de agua urbanos y 35 sistemas de saneamiento urbanos operados por gobiernos municipales;

(e) Reparación de 37 sistemas urbanos de agua operados por el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA);

(f) Construcción de 10 nuevos sistemas de agua y saneamiento para poblaciones reubicadas en apoyo a los esfuerzos para proporcionar soluciones permanentes de vivienda para familias desplazadas;

(g) Planes de preparación para desastres desarrollados para 40 municipalidades;

(h) Oficiales locales y líderes comunitarios capacitados en la preparación para desastres;

(i) Desarrollo de un sistema de comunicaciones confiable para el manejo de desastres; y

(j) Construcción de sistemas integrales de drenaje pluvial en 12 ciudades primarias y secundarias."

(b) Development of Urban Development Strategies in 40 secondary cities;

(c) Increased citizen participation in reconstruction decision-making;

(d) Rehabilitation and expansion of approximately 25 urban water supply and 35 urban sanitation systems operated by municipal governments;

(e) Repair of 37 urban water systems operated by the National Autonomous Water and Sanitation Service (SANAA);

(f) Construction of 10 new water and sanitation systems for resettled populations in support of efforts to provide permanent housing solutions for displaced families;

(g) Disaster preparedness plans developed for 40 municipalities;

(h) Local officials and community leaders trained in disaster preparedness;

(i) Development of a dependable communications system for disaster management; and

(j) Comprehensive storm drainage systems constructed in 12 primary and secondary cities."

(2) Metas

Se espera completar los siguientes logros bajo el componente de la Actividad para el Desarrollo Municipal antes o en la Fecha de Terminación:

- (a) Número de municipalidades participantes que regresen por lo menos a los niveles de generación de ingresos existentes en septiembre de 1998: 15 para diciembre de 1999, 20 para diciembre del 2000;
- (b) Establecimiento de procesos para la participación comunitaria en la toma de decisiones referentes a la reconstrucción en las municipalidades participantes;
- (c) Sistemas administrativos y financieros de contabilidad y de control interno establecidos en todas las municipalidades participantes para permitir un manejo confiable y transparente de los esfuerzos de reconstrucción.
- (d) Número de sistemas de agua de propiedad municipal rehabilitados y expandidos: 25 sistemas en ciudades secundarias a través del FHIS;
- (e) Número de sistemas de agua propiedad del SANAA rehabilitados: 37 sistemas urbanos;
- (f) Número de sistemas de alcantarillado rehabilitados y expandidos: 35 en ciudades secundarias a través del FHIS;
- (g) Número de lugares para reubicar a personas desplazadas por el Mitch con servicios de agua y saneamiento: 10 en ciudades secundarias;

(2) Targets

The following accomplishments are expected to be completed under the component for the Municipal Development Activity on or before the Completion Date:

- (a) Number of participating municipalities back to at least September 1998 levels of local income generation in real terms: 15 by December 1999, 20 by December 2000;
- (b) Processes in place for community participation in reconstruction decision-making in participating municipalities;
- (c) Administrative and financial accounting and internal control systems in place in all participating municipalities to allow for accountable and transparent management of reconstruction efforts;
- (d) Number of municipality-owned water systems rehabilitated and expanded: 25 secondary city systems through FHIS;
- (e) Number of SANAA-owned water systems rehabilitated: 37 urban systems;
- (f) Number of sewage systems rehabilitated and expanded: 35 secondary city systems through FHIS;
- (g) Number of relocation sites for persons displaced by Mitch with water and sanitation services: 10 in secondary cities;

(h) Número de Estrategias de Desarrollo Urbano siendo ejecutadas en ciudades secundarias: 20 para julio del 2000, 40 para diciembre del 2001;

(i) Número de municipalidades aplicando medidas para la mitigación de desastres como resultado de los esfuerzos de planificación: 15 para julio del 2000, 30 para diciembre del 2001;

(j) Número de municipalidades con sistemas de drenaje pluviales mejorados: 12 en ciudades secundarias para diciembre del 2001;

(k) Oficiales locales y líderes comunitarios capacitados en la preparación para desastres (cubriendo todas las municipalidades en el país); y

(l) Desarrollo de un sistema confiable de comunicaciones para el manejo de desastres."

5. El Marco de Resultados incluido como el Adjunto 1 al Anexo I al Convenio es por este medio suprimido en su totalidad y el nuevo "Marco de Resultados" incluido como Adjunto A a esta Enmienda lo sustituye.

6. El plan financiero ilustrativo que contiene el presupuesto de la donación en dólares de la USAID, incluido como Adjunto 2 al Anexo I al Convenio, es por este medio suprimido en su totalidad y el nuevo plan financiero ilustrativo incluido como Adjunto B a esta Enmienda lo sustituye.

(h) Number of Urban Development Strategies being implemented in Secondary Cities: 20 by July 2000, 40 by December 2001;

(i) Number of municipalities applying disaster mitigation measures as an outcome of planning efforts: 15 by July 2000, 30 by December 2001;

(j) Number of municipalities with improved storm drainage: 12 secondary cities by December 2001;

(k) Local officials and community leaders trained in disaster preparedness (covering all municipalities in the country); and

(l) Development of a dependable communications system for disaster management."

5. The Results Framework included as Attachment 1 to Annex I to the Agreement is hereby deleted in its entirety and the new "Results Framework" included as Attachment A to this Amendment is substituted therefor.

6. The illustrative financial plan containing the USAID dollar grant budget, included as Attachment 2 to Annex I to the Agreement, is hereby deleted in its entirety and the new illustrative financial plan included as Attachment B to this Amendment is substituted therefor.




7. El Anexo I al Convenio es además enmendado al agregar al final del mismo un nuevo Adjunto 6 el cual se incluirá como Adjunto C a esta Enmienda y el cual será titulado "Descripción de la Actividad para el Componente para el Mejoramiento de la Respuesta de los Gobiernos Locales a las Necesidades de los Ciudadanos".


A excepción de lo aquí enmendado, todos los demás términos y condiciones del Convenio permanecen en pleno vigor y efecto.

EN FE DE LO CUAL, los Estados Unidos de América y el Donatario, cada cual actuando a través de sus representantes debidamente autorizados, han dispuesto que esta Enmienda del Convenio de Donación de Objetivo Especial sea firmada en sus nombres y entregada el día y año indicados al inicio del mismo.


REPUBLICA DE HONDURAS



Carlos Roberto Flores Facussé  
Presidente de la República



Gabriela Núñez de Reyes  
Ministra de Finanzas




Moisés Starkman  
Ministro  
Secretaría Técnica y de Cooperación  
Internacional (SETCO)

7. Annex I to the Agreement is further amended by adding at the end thereof a new Attachment 6 which is included as Attachment C to this Amendment and which is entitled "Activity Description for the Component for the Improved Responsiveness of Local Governments to Citizen Needs Activity".

Except as herein amended, all other terms and conditions of the Agreement remain in full force and effect.

IN WITNESS WHEREOF, the United States of America and the Grantee, each acting through its duly authorized representatives, have caused this Special Objective Grant Agreement Amendment to be signed in their names and delivered as of the day and year first above written.

UNITED STATES OF AMERICA



Paul Trivelli  
Chargé d'Affaires a.i.



Elena L. Brineman  
Mission Director


**In Representation of the Honduran  
Social Investment Fund  
(En Representación del Fondo  
Hondureño de Inversión Social):**



---

**Ileana Waleska Pastor**  
Ministra  
Fondo Hondureño de Inversión  
Social (FHIS)


**In Representation of the Municipalities  
(En Representación de las  
Municipalidades):**



---

**Arnold David Sánchez**  
Presidente de la Junta Directiva  
Asociación de Municipios de Honduras  
(AMHON)




**In Representation of the National  
Autonomous Water and Sanitation  
Service (SANAA)  
(En Representación del Servicio  
Autónomo Nacional de Acueductos y  
Alcantarillados (SANAA)):**



---

**Humberto de Jesús Puerto**  
Gerente  
Servicio Autónomo Nacional  
de Acueductos y Alcantarillados  
(SANAA)

# SPECIAL OBJECTIVE RESULTS FRAMEWORK (MARCO DE RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECIAL)

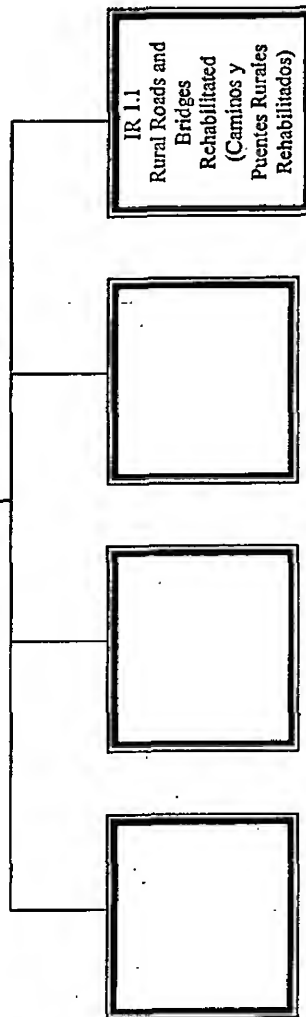

## INDICATORS

- (a) Reconstruction and improvement of unsurfaced, farm-to-market roads (Reconstrucción y mejoramiento de caminos de acceso sinca-mercado sin pavimentación).
- (b) Reconstruction and improvement of two-lane concrete bridges or fords (Reconstrucción y mejoramiento de puentes de concreto de dos vías o de vados).

(c) Repaving of affected paved roads in critical areas not addressed by other donor (Repavimentación de carreteras pavimentadas en áreas no servidas por otros donantes).

(d) Cobblestoning of urban streets in affected areas with the greatest need of generation of temporary employment (Empedrado de calles urbanas en las zonas afectadas de mayor necesidad de generación de empleo temporal).

**CRITICAL HURRICANE RECONSTRUCTION  
NEEDS MET**

(Necesidades Críticas de Reconstrucción por el  
Huracán Alcanzadas)

**IR 4**

**Permanent Housing developed for  
Displaced Families**

(Desarrollo de Vivienda Permanente para  
Familias Desplazadas)

**IR 4.1**

Construction of Transitional and  
Temporary Shelters to Meet the  
Temporary Housing Needs of  
Over 2,000 Displaced Families  
Until Permanent Solutions are  
Developed

(Construcción de Albergues  
Transitorios y Temporales para  
Cubrir las Necesidades de Vivienda  
de Más de 2,000 Familias  
Desplazadas Mientras se  
Desarrollan Soluciones Permanentes)

**IR 4.2**

Development of 2,800 Permanent  
Housing Units Through Support  
to NGO Programs

(Desarrollo de 2,800 Unidades de  
Vivienda Permanentes Mediante el  
Apoyo a los Programas de la ONG)

**IR 4.3**


Development of Basic Sites and  
Services for Housing  
Developments for Resettled  
Families

(Desarrollo de Lugares y Servicios  
Básicos para el Desarrollo de  
Viviendas para las Familias  
Reubicadas)

**IR 4.4**

Provision of Community  
Development Services to  
Transitional Shelter Residents  
and Newly Resettled Communities

(Sumistro de Servicios de  
Desarrollo Comunitario para los  
Residentes de los Albergues  
Transitorios y Comunidades Recién  
Ubicadas)

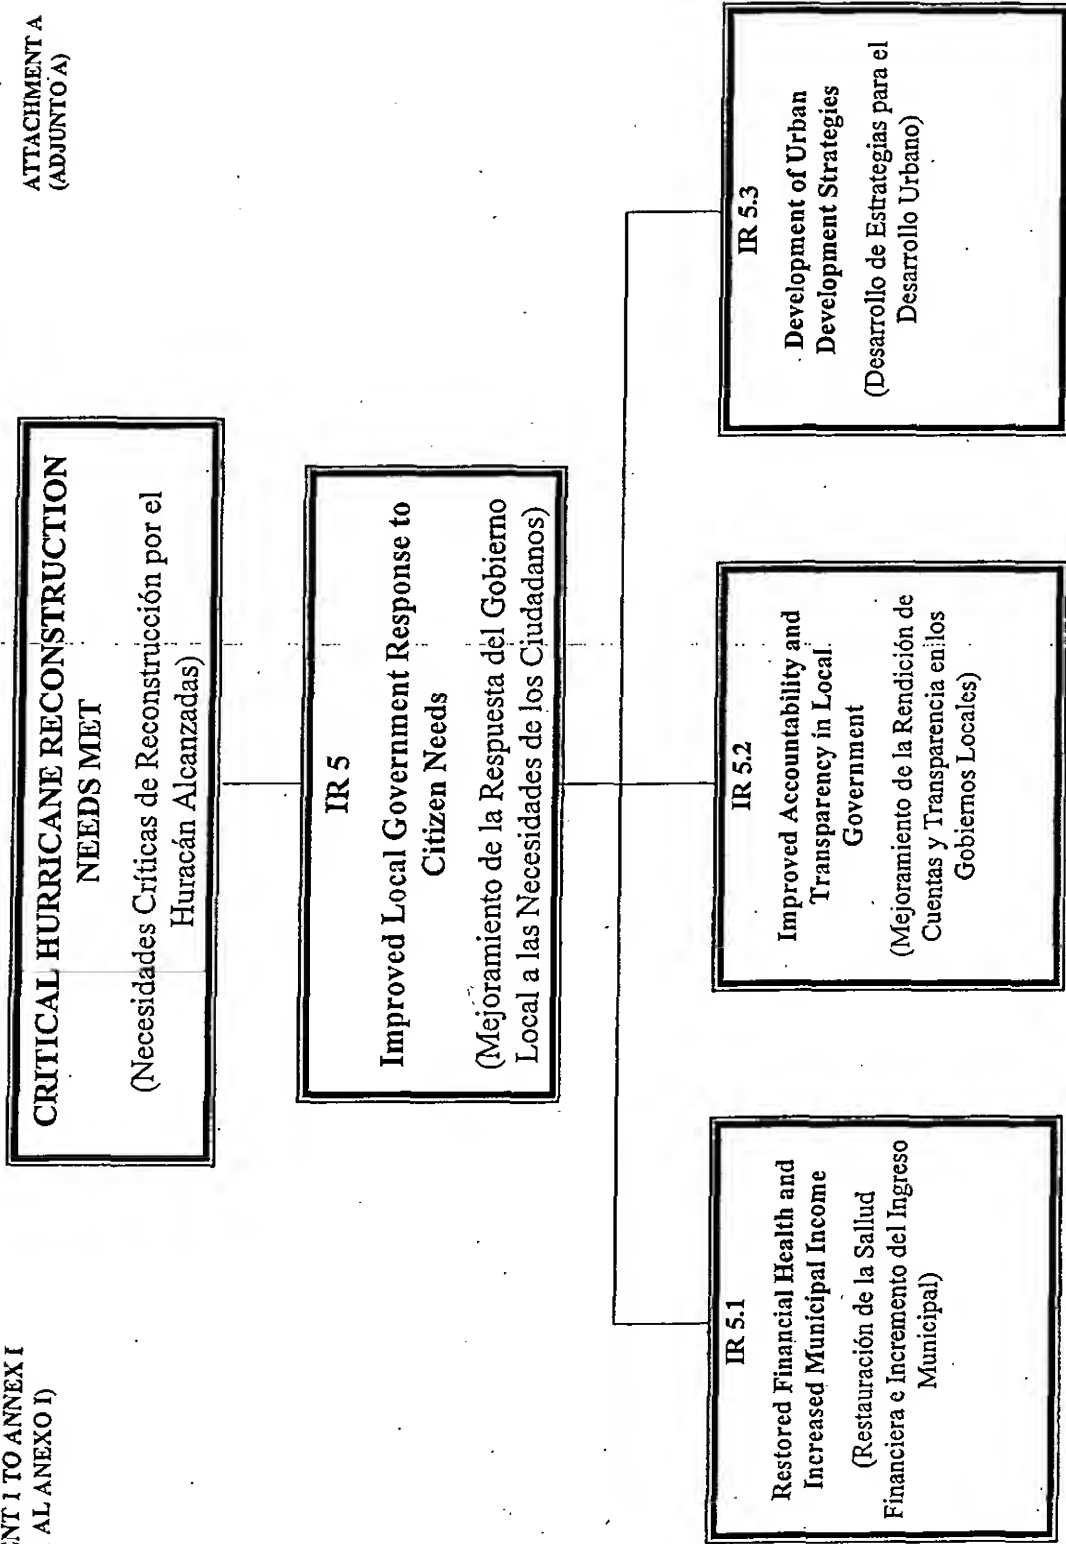

ATTACHMENT 2 TO ANNEX 1  
(ADJUNTO 2 AL ANEXO 1)  
ILLUSTRATIVE SPECIAL OBJECTIVE BUDGET  
(PRESUPUESTO ILUSTRATIVO DEL OBJETIVO ESPECIAL)  
HURRICANE RECONSTRUCTION PROGRAM  
(PROGRAMA DE RECONSTRUCCION POR EL HURACAN)  
US DOLLARS  
(DOLARES ESTADOUNIDENSES)

SUMMARY BUDGET BY ACTIVITY

| Activity<br>(Actividad) | Activity/Description<br>(Descripción de la Actividad)  | This Obligation<br>(Esta Obligación) | Cumulative Obligations<br>(Obligaciones Acumulativas) | Life of Activity<br>(Vida de la Actividad) |
|-------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| 522-0410.00             | Emergency Reconstruction of Roads and Bridges<br>(Reconstrucción de Emergencia de Caminos y Puentes)   | 0                                    | 50,000,000  | 50,000,000                                 |
| 522-0410.03             | Public Health Protected<br>(La Salud Publica Protegida)  | 75,000,000                           | 75,000,000  | 75,000,000                                 |
| 522-0410.04             | Permanent Housing Developed for Displaced Families<br>(Desarrollo de Vivienda Permanente para Familias Desplaz)  | 0                                    | 18,000,000  | 18,000,000                                 |
| 522-0410.05             | Improved Responsiveness of Local Government to<br>Citizen Needs Activity<br>(Mejoramiento de la Respuesta del Gobierno Local<br>a las Necesidades de los Ciudadanos) | 24,000,000                           | 24,000,000  | 24,000,000                                 |
|                         | <b>TOTAL</b>   | <b>99,000,000</b>                    | <b>167,000,000</b>                                    | <b>167,000,000</b>                         |

\* Subject to the availability of funds and otherwise as provided in Section 3.1(b) of the Agreement.  
(\*Sujeto a la disponibilidad de fondos y tal como sea estipulada en la Sección 3.1(b) del Convenio.)

ATTACHMENT 2 TO ANNEX 1  
(AJUNTO 2 AL ANEXO 1)  
ILLUSTRATIVE SPECIAL OBJECTIVE BUDGET  
(PRESUPUESTO ILUSTRATIVO DEL OBJETIVO ESPECIAL)  
HURRICANE RECONSTRUCTION PROGRAM  
(PROGRAMA DE RECONSTRUCCION POR EL HURACAN)  
US DOLLARS  
(DOLARES ESTADOUNIDENSES)

| Element<br>(Elemento) | Activity Description<br>(Descripción de la Actividad)   | This Obligation<br>(Esta Obligación) | Cumulative Obligations<br>(Obligaciones Acumulativas) | Life Of Activity<br>(Vida de la Actividad) |
|-----------------------|---|--------------------------------------|---|--|
|                       | Emergency Road and Bridge Reconstruction Activity<br>(Actividad de Emergencia de Reconstrucción de Caminos y Puentes) 522-0410.00 |                                      |   |  |
| 1                     | Road and Bridge Reconstruction (Reconstrucción de Caminos y de Puentes)   | 46,800,000                           | 46,800,000  | 46,800,000                                 |
| 2                     | Activity Management and Technical Assistance<br>(Administración de la Actividad y Asistencia Técnica)                             | 1,600,000                            | 3,000,000   | 3,000,000                                  |
| 3                     | Evaluations and Audits (Evaluaciones y Auditorías)  | 200,000                              | 200,000   | 200,000                                    |
|                       | <b>TOTAL</b>  | <b>48,600,000</b>                    | <b>50,000,000</b>                                     | <b>50,000,000*</b>                         |

\* Subject to the availability of funds and otherwise as provided in Section 3.1(b) of the Agreement.  
(\*Sujeto a la disponibilidad de fondos y tal como sea estipulada en la Sección 3.1(b) del Convenio.)

ATTACHMENT 2 TO ANNEX 1  
(ADJUNTO 2 AL ANEXO 1)  
ILLUSTRATIVE SPECIAL OBJECTIVE BUDGET  
(PRESUPUESTO ILUSTRATIVO DEL OBJETIVO ESPECIAL)  
HURRICANE RECONSTRUCTION PROGRAM  
(PROGRAMA DE RECONSTRUCCION POR EL HURACAN)  
US DOLLARS  
(DOLARES ESTADOUNIDENSES)

| Element<br>(Elemento) | Activity Description<br>(Descripción de la Actividad)   | This Obligation<br>(Esta Obligación) | Cumulative Obligations<br>(Obligaciones Acumuladas) | Life Of Activity<br>(Vida de la Actividad) |
|-----------------------|---|--------------------------------------|---|--|
|                       | Permanent Housing Developed for Displaced Families<br>Activity (Actividad para el Desarrollo de Vivienda<br>Permanente para Familias Desplazadas) 522-0410.04 |                                      |   |  |
| 1                     | Housing (Vivienda)  | 17,143,000                           | 17,143,000  | 17,143,000                                 |
| 2                     | Activity Management and Technical Assistance<br>(Administración de la Actividad y Asistencia Técnica)   | 857,000                              | 857,000   | 857,000                                    |
|                       | TOTAL   | 18,000,000                           | 18,000,000  | 18,000,000*                                |

\* Subject to the availability of funds and otherwise as provided in Section 3.1(b) of the Agreement.  
(\*Sujeto a la disponibilidad de fondos y tal como sea estipulada en la Sección 3.1(b) del Convenio.)



ATTACHMENT 2 TO ANNEX 1  
(ADJUNTO 2 AL ANEXO 1)  
ILLUSTRATIVE SPECIAL OBJECTIVE BUDGET  
(PRESUPUESTO ILUSTRATIVO DEL OBJETIVO ESPECIAL)  
HURRICANE RECONSTRUCTION PROGRAM  
(PROGRAMA DE RECONSTRUCCION POR EL HURACAN)  
US DOLLARS  
(DOLARES ESTADOUNIDENSES)

| Element<br>(Elemento) | Activity/Description<br>(Descripción de la Actividad)  | This Obligation<br>(Esta Obligación) | Cumulative Obligations<br>(Obligaciones Acumulativas) | Life of Activity<br>(Vida de la Actividad) |
|-----------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| 10                    | Public Health Protected (Protección de la Salud Pública) 522-0410.03   |                                      |   |  |
| 11                    | MD-Urban Water and Sanitation (Agua y Saneamiento Urbano)<br>MD-Audits (Auditorías)  | 74,800,000<br>200,000                | 74,800,000<br>200,000                                 | 74,800,000<br>200,000                      |
|                       | SUBTOTAL   | 75,000,000                           | 75,000,000  | 75,000,000                                 |
|                       | Improved Responsiveness of Local Government to<br>Citizen Needs Activity<br>(Mejoramiento de la Respuesta del Gobierno Local a<br>las Necesidades de los Ciudadanos) 522-0410.05 |                                      |   |  |
| 1                     | Mitigation Infrastructure (Infraestructura de Mitigación)  | 17,777,000                           | 17,777,000  | 17,777,000                                 |
| 2                     | Equipment (Equipo)   | 1,213,000                            | 1,213,000   | 1,213,000                                  |
| 3                     | Technical Assistance and Training (Asistencia Técnica y<br>Capacitación)   | 4,596,000                            | 4,596,000   | 4,596,000                                  |
| 4                     | Activity Management (Administración)   | 229,000                              | 229,000   | 229,000                                    |
| 5                     | Evaluations (Evaluaciones)   | 60,000                               | 60,000  | 60,000                                     |
| 6                     | Audits (Auditorías)  | 125,000                              | 125,000   | 125,000                                    |
|                       | SUBTOTAL   | 24,000,000                           | 24,000,000  | 24,000,000                                 |
|                       | TOTAL  | 99,000,000                           | 99,000,000  | 99,000,000                                 |

\* Subject to the availability of funds and otherwise as provided in Section 3.1(b) of the Agreement.  
(\*Sujeto a la disponibilidad de fondos y tal como sea estipulada en la Sección 3.1(b) del Convenio.)

## STATEMENT PER CASE-ZABLOCKI ACT

This Special Objective Grant Agreement Amendment No. 3 provides \$99.0 million to the Government of Honduras for the Municipal Activity of the Hurricane Reconstruction Program (HRP).



Roberta M. Cavitt  
Acting Office Director  
Strategy and Program Support Office  
USAID/Honduras/SPS

"Certified to be a true copy of the original signed by Ing. Carlos Roberto Flores Facussé, President of the Republic of Honduras, Mrs. Gabriela Núñez de Reyes, Minister of Finance, Mr. Moisés Starkman, Minister of SETCO, Mrs. Ileana Waleska Pastor, Minister of the Honduran Social Investment Fund (FHIS), Mr. Arnold David Sánchez, President of the Board of the Association of Municipalities of Honduras (AMHON), Mr. Humberto de Jesús Puerto, Manager of the National Autonomous Water and Sanitation Service (SANAA), Mr. Paul A. Trivelli, Chargé d'Affaires a.i, United States American Embassy, and Ms. Elena L. Brineman, USAID Mission Director."
